



Migration vers Koha à Sciences Po Grenoble

Retour d'expérience

Lundi 24 mai 2013

Aurélie Fichot





Le contexte

- 18 personnes permanentes (2 départements)
- Budget annuel : 500 000 €
- 120 000 documents (5 000 nouveautés / an)
 - 80 000 notices bibliographiques
 - 96 000 exemplaires
 - 1 600 périodiques (dont 800 titres morts)
 - 8 000 mémoires et thèses numérisées
- 1 700 lecteurs actifs dont 150 enseignants-chercheurs
 - 120 000 visites / an
 - 50 000 prêts / an





Le projet

- Un changement de SIGB pour répondre à plusieurs besoins
- Une opération inscrite dans le projet d'établissement (contrat quadriennal 2007-2010)
- Jun planning prévisionnel étalé sur 3 ans
 - → 2008 : veille et rédaction du cahier des charges
 - → 2009 : tests et choix d'un SIGB
 - → 2010/2011 : migration et reprise des données





Etat des lieux

- 3 catalogues
 - AB6 : ouvrages
 - Eos Glass puis Eos Web : périodiques
 - Base locale : mémoires/thèses (dépôt/archivage)
- Appartenance au réseau Odyssée des BU de l'UPMF et de Stendhal (convention avec SICD2)
- Besoin de changer de SIGB : être site pilote pour l'ensemble du réseau





Les besoins

- Regrouper nos 3 catalogues en 1 seul
- Proposer un outil plus efficace, plus complet, plus moderne, tant pour les professionnels que pour le public (OPAC Web 2.0)
- Avoir la main sur les paramétrages, les droits d'accès, les imports de données...
- Intégrer le SIGB dans le système d'informations de l'établissement





Le catalogue AB6 : ouvrages

- Acquisitions des monographies, commandes
- Circulation
- OPAC








Le catalogue EOS Web : périodiques

- Accès aux périodiques électroniques
- Bulletinage
- Abonnements

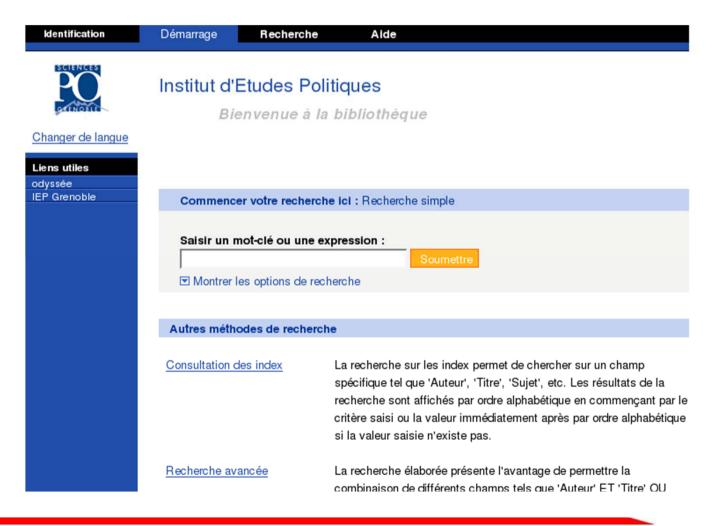





La base locale : mémoires et thèses

Registre des 9 000 mémoires et thèses déposés

depuis 1958

2008 : Dépôt numérique des mémoires obligatoire







Pourquoi Koha?

- Culture d'usage de logiciels libres : Scolarix (Cocktail), WordPress, Dokeos, Firefox, OpenOffice...
- Retours d'expériences positifs en BU (Aix-Marseille, Lyon2/Lyon3, Saint-Etienne) et en BM
- Koha programmé dans de nombreuses bibliothèques
 (Bulac, SCD Limoges, Paris Descartes, Rennes 2,...)
 = Evolutions rapides attendues
- Répond à l'ensemble des besoins pour l'OPAC : URL stable, RSS, Zotero, rebonds (E-books et autres catalogues)...
- Gestion des notices MARC et compatibilité SUDOC





Phase de test et choix de Koha

- Retours positifs des collègues : Gain de temps, maîtrise des paramétrages
- Coût de l'hébergement Koha couvert par l'économie réalisée par l'arrêt d'Eos Web (4 000 €)
- Intégration complète au site WordPress de l'IEPG
 + Webservice pour le SUDOC
 - → 2009 : Phase de test concluante
- Convention dénoncée par SICD2
 - → Rentrée 2010 : Décision de passer à Koha





Migration vers Koha - 1

- Octobre 2010 : Lancement de la migration (paramétrages, création comptes professionnels...)
- Novembre Décembre 2010 : Reprise des données des périodiques, paramétrages, création des abonnements, bulletinage,...
- Fin décembre 2010 : Mise à disposition de nos notices bibliographiques par l'ABES
- Janvier Mars 2011 : Budget, commandes/acquisitions des ouvrages, reprise des exemplaires en libre accès...





Migration vers Koha – 2

- Avril 2011 : 40 000 doc en libre accès dans Koha, ouverture de l'OPAC aux lecteurs, et début des transactions
- Mai 2011 Décembre 2012 : Production dans Koha, enregistrement des exemplaires des magasins (suite de la « kohatisation » : environ 80 000 livres)
- Juin 2011 : Mise en place du Webservice Mir@bel
- Septembre 2011 : Passage global à Koha pour toutes les opérations
 - → 1 migration en 12 mois





Finalisation de la migration vers Koha

- Mars 2012 : Versements des mémoires et thèses. Les 3 catalogues ne font qu'un !
- Avril 2012 : Après déploiement, nous disposons de notre propre ILN dans le SUDOC
- Eté 2013 : Fin de la « kohatisation » et de la rétroconversion





Bilan très positif côté lecteurs

- Objectifs initiaux remplis :
 - Un seul catalogue
 - Un OPAC enrichi (fonctionnalités Web 2.0)
 - Une meilleure communication
 - Une seule interface complètement intégrée dans le site Web de Sciences Po Grenoble
- De nouveaux services intégrés chaque trimestre :
 - Alertes mail de l'échéance de retour d'un document
 - Suggestions d'achat en ligne
 - 🦱 Réservations et renouvellements en ligne,..

EXPLORER LA BIBLIOTHÈQUE



BIBLIOTHÈQUE DE SCIENCES PO GRENOBLE Chercher

Tous les mots

Aller

Panier

Listes

Recherche avancée | Feuilleter par auteur ou sujet



Vue normale

L'administration pénitentiaire face aux principes de la nouvelle gestion publique : une réforme en question(s)[colloque les 20, 21 et 22 janvier 2010]

sous la direction de Jean-Charles Froment et Martine Kaluszynski [publié par le Cerdhap, Centre d'études et de recherche sur le droit, l'histoire, l'administration publique] ;

Auteur: Froment, Jean-Charles; Kaluszynski, Martine (1958-....)

: Centre d'études et de recherche sur le droit, l'histoire et l'administration publique, Saint-Martin-d'Hères, Isère ; France, Direction de l'administration pénitentiaire ; Politiques publiques, actions politiques, territoires, Saint-

Martin-d'Hères, Isère

Editeur : Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, impr. 2011

Description: 1 vol. (271 p.)

ISBN: 978-2-7061-1668-1.Localiser ce document dans le SUDOC

Bibliographie: Notes bibliogr. en bas de pages.

Sujet - Nom commun: Prisons -- Administration -- Réorganisation -- Congrès | Prisons -- Politique publique -- Congrès

IEP GRENOBLE: Cote: 365 FRO





EXPLORER LA BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE DE SCIENCES PO GRENOBLE Chercher

Tous les mots

Aller

Panier

Listes

Recherche avancée | Feuilleter par auteur ou sujet



Alternatives internationales

Vue normale

: Alternatives économiques, Paris ; Télérama, Périodique

Editeur: Paris: Alternatives internationales, 2002-

ISSN: 1634-6386.Localiser ce document dans le SUDOC

Périodicité : Trimestriel; Mensuel; Bimestriel. Etat de collection : IEP GRENOBLE :no. 1 (2002)-.....

Sujet - Nom commun: Économie politique -- Périodiques | Relations économiques internationales -- Périodiques | Relations internationales -- 2001-.... -- Périodiques

- Texte intégral en ligne:
- Cairn Restreint 2005 2013
- · Sommaire en ligne:
 - Sign@l Libre 2008 -
 - Rafid Libre 2003-10-01 -

IEP GRENOBLE: Cote: 100 1815

Ce document apparaît dans les listes : Exposition 2012 - Election présidentielle aux USA



Exemplaires (54)	Notes	Abonnements	Images	

Type de document	Localisation \$	Cote \$	Info vol. 💠	Situation \$	Date de retour	\$
Revue	IEP En accès libre	327 (Parcourir l'étagère)	H. S. N. 1	Disponible		
Revue	IEP	327 (Parcourir l'étagère)	H. S. N. 10	Disponible		





Bilan très positif côté professionnel

- Travail facilité et gain de temps sur opérations métier
- Maîtrise des politiques de prêt adaptées à nos besoins (fonds spécifiques Recherche et ENA)
- Affichage de messages dans le compte lecteur à destination du bibliothécaire
 - → 1 migration rapide et éprouvante, un fort investissement du personnel, une grande implication de l'équipe pour un grand bénéfice





Ressources humaines et compétences

- Chefs de projet : 3 docs + 1 tech DSI + 1 BibLibre
 - Gestion de projet, suivi administratif et financier
- Co-administrateurs Koha: 2 docs + 1 tech DSI
 - Paramétrages et petits développements, modification des feuilles de style, requêtes SQL...
 - Relations avec la communauté et avec BibLibre
- Gestionnaires : Tout le personnel de la doc
 - Travailler dans un module dédié, évaluer les versions
 - Rapporter des bugs, proposer des améliorations
 - Contrôler les reprises de données, les versements...





Environnement technique

- 2 serveurs hébergés BibLibre (production + test)
- **Zebra** 2.0.44, Piwik 1.12
- Modules spécifiques
 - Moulinette SUDOC
 - Moulinette d'import des mémoires et thèses
 - Webservice REST Mirabel_to_koha
 - Accès direct OPAC intégré WordPress
- Versions utilisées :
 - 3.2 en 2011 lors de la migration
 - 3.8 en décembre 2012 (version communautaire)





Coût

- Lancement du projet (2009) : 2 700 €
 - 700 € : Réunion de lancement, installation, paramétrages
 - 2 000 €: 3 jours de formation pour 3 groupes
- Déroulement du projet (2010) : 6 000 €
 - Installation et hébergement
 - Groupes de travail autour du projet
 - Reprise des données et formations
- → Coût annuel en 2013 : 7 000 € (maintenance + hébergement des 2 serveurs + Piwik)





Travail avec la communauté

- Jusqu'en 2011 : activité mineure
 - Participation aux listes de diffusion
 - Participation aux Symposiums Koha
 - Ouverture et gestion de « tickets » Mantis
- Depuis 2012 : Implication plus forte
 - Communication autour de notre expérience
 - Travail dans les « bacs à sable »
 - Participation au KackFest 2013 (BibLibre)
 - Traduction en français de la version 3.12
 - Participation à 3 ateliers au Symposium 2013
